


LA LIGNE **C**
AVANCE



LA LIGNE **B**
VA PLUS LOIN

Avancement

Octobre 2023

A venir

Fin 2023 / T1 2024

Labège Zone Commerciale



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine / octobre 2023




LA LIGNE **C**
AVANCE



LA LIGNE **B**
VA PLUS LOIN

CREATION DES VIADUCS


Création des
fondations

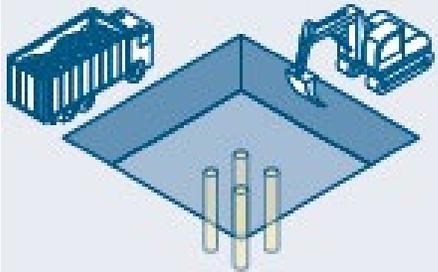


Réalisation
des piles



Mise en place d'une
poutre de lancement
et pose des voussoirs

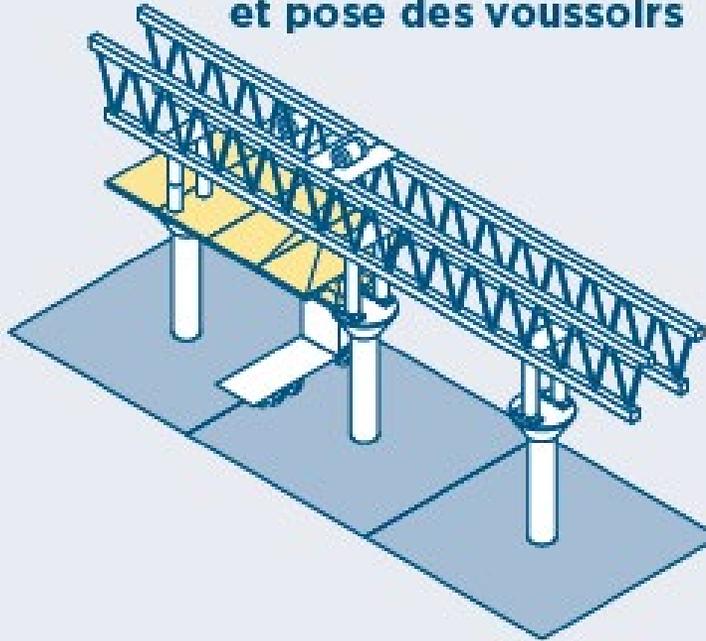

Création et
équipement
des tabliers

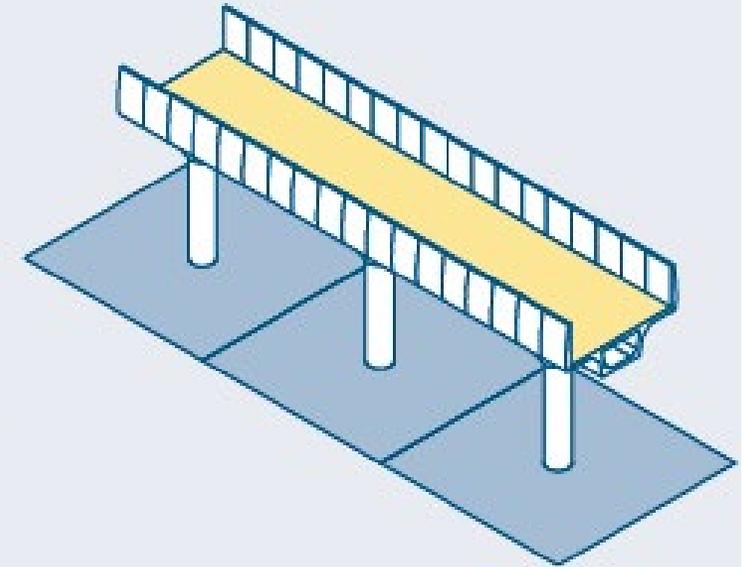

Avec 2 spécificités :


Création des piles dans le lac de l'INP et lançage au-dessus de l'A61 / A620 / Hers / RD 916 (250 m)



LA LIGNE **C**
AVANCE



LA LIGNE **B**
VA PLUS LOIN

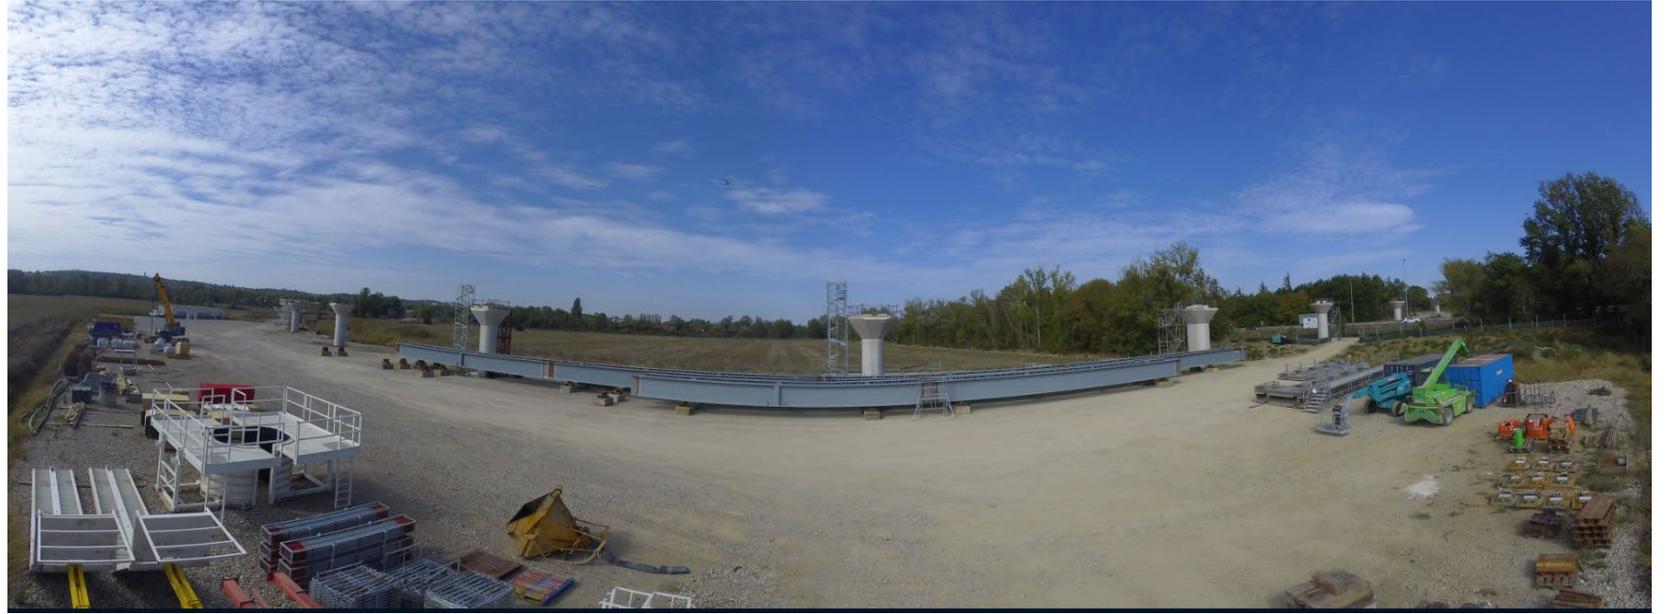



LA LIGNE **C**
AVANCE



LA LIGNE **B**
VA PLUS LOIN

CREATION DES VIADUCS





LA LIGNE **C**
AVANCE



LA LIGNE **B**
VA PLUS LOIN

CREATION DES VIADUCS




<https://www.youtube.com/watch?v=TLNx7cQIAAc>



CHANTIER CLB – LABEGE – AUTOROUTE

LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

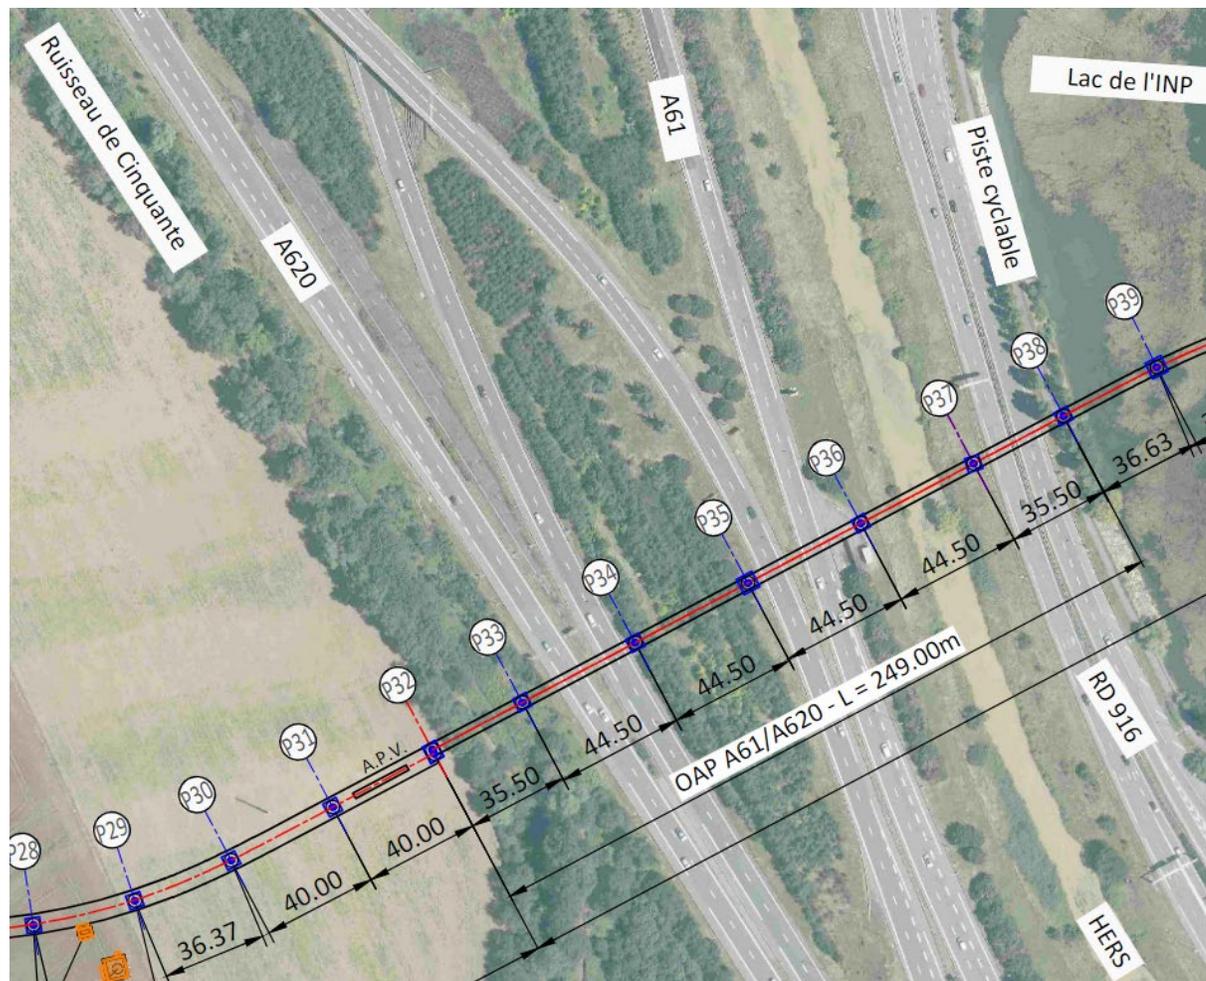

Avancement

Tous réseaux déviés
Piles réalisées

A venir Fin 2023 / T1 2024

Assemblage du tablier dans la parcelle agricole

Lançages : 3 phases de 2 nuits (+2 de secours) :
6 et 7 novembre
20 et 21 novembre
4 et 5 décembre
Sous fermeture de l'autoroute (22h – 6h)

<https://www.youtube.com/watch?v=RgouTnBuL7w>






LA LIGNE C
AVANCE



LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

CHANTIERS – LABEGE – LAC INP

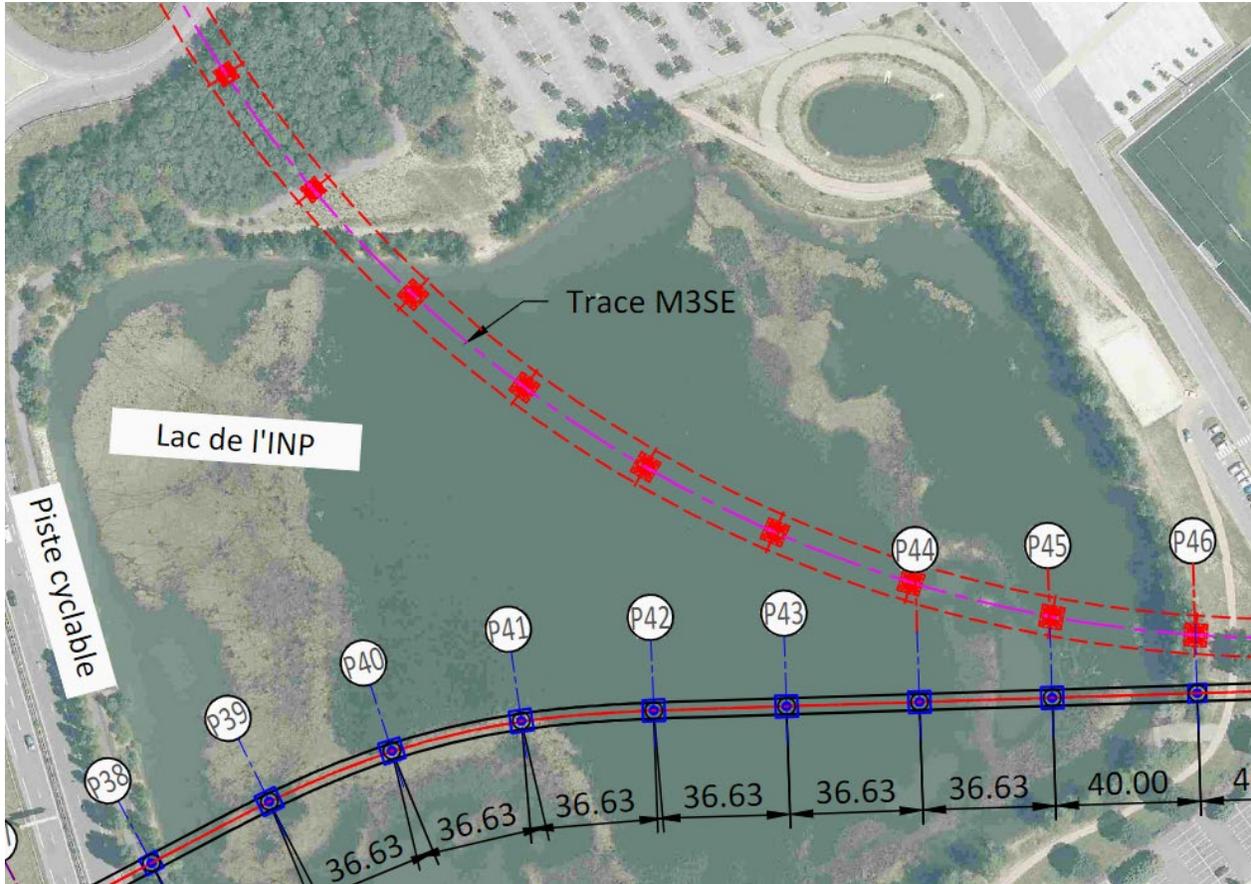


Avancement

Déviation piste cyclable en place depuis mai
Pieux CLB terminés
Installation chantier Ligne C

A venir Fin 2023 / T1 2024

Réalisation semelles et fûts CLB
Réalisation estacade et piles Ligne C
(photo HS2 – UK <https://youtu.be/possLI5Ub4?t=138>)

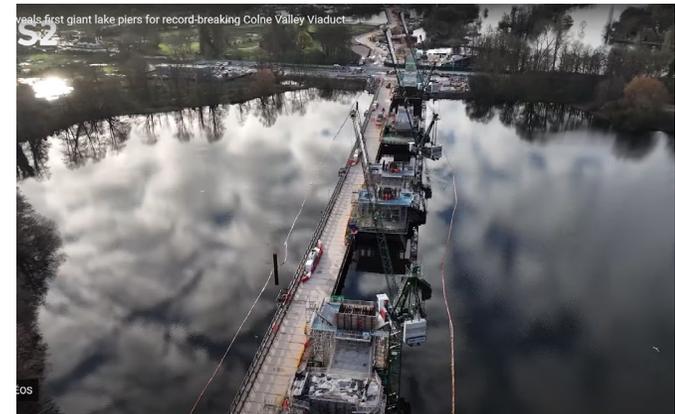




LA LIGNE C
AVANCE



LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

CHANTIERS – LABEGE – PLACE DU COMMERCE

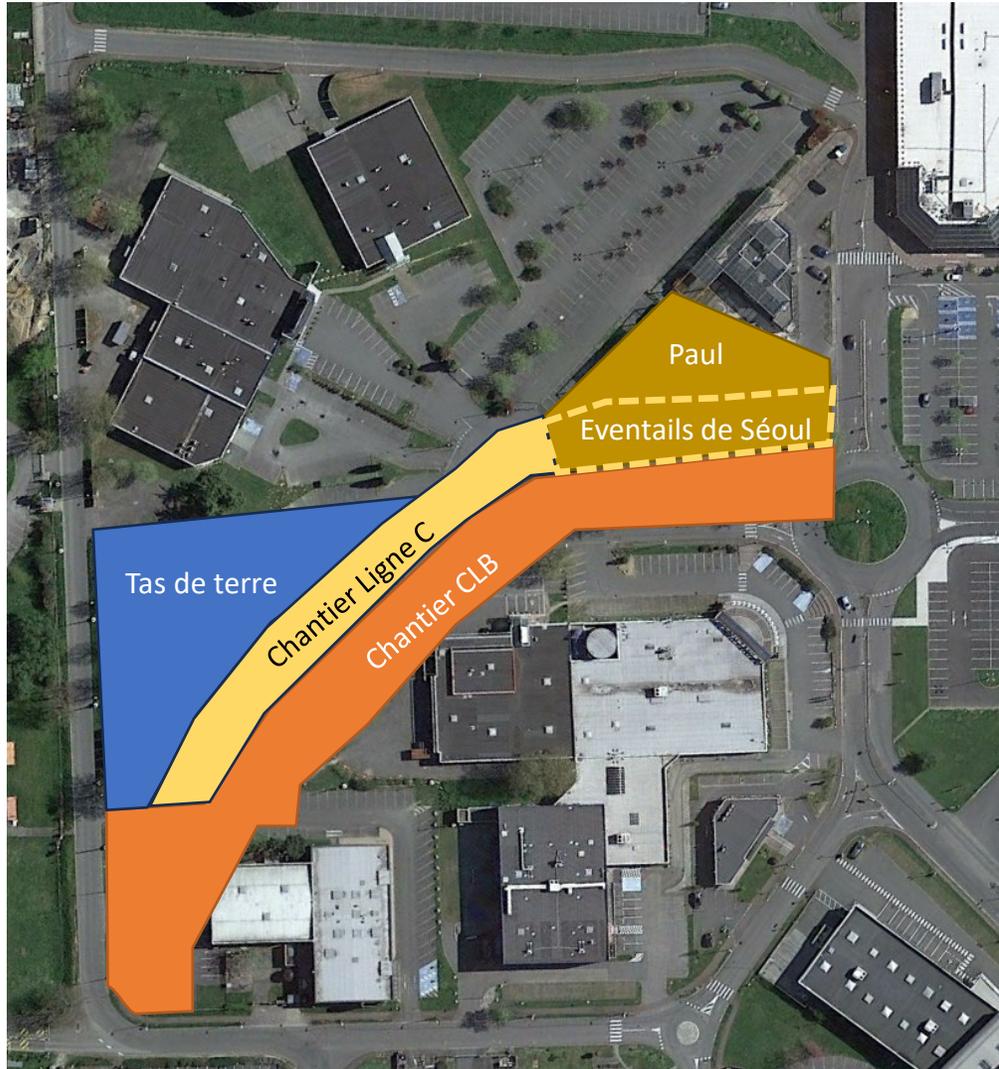

Avancement

Stockage temporaire de terre (chantier CLB) depuis cet été pour 18 mois

Emprises chantier CLB occupées depuis le 04/09

Piles CLB en cours de réalisation

Fin des travaux de déviation des réseaux (Enedis)

Déconstruction des bâtiments Paul, Eventails de Séoul)

A venir Fin 2023 / T1 2024

Réalisation des piles CLB

Mise en place tablier CLB (février à mi-mars)

Reprises sur parkings (Action Carrefour)

Cheminement piétons CASA <-> Carrefour à renforcer



LA LIGNE C
AVANCE



LA LIGNE B
VA PLUS LOIN

CHANTIERS – LABEGE – CARREFOUR

Avancement


Piles CLB Terminées
Assemblage poutre CLB en cours

A venir Fin 2023 / T1 2024

Mise en place tablier CLB à partir de fin novembre (jusque fin janvier).

Pas de fermeture de la rue du commerce à prévoir (bascule de nuit en février)


Emprises chantier ligne C à partir du 24 octobre (complétées côté CLB début décembre)

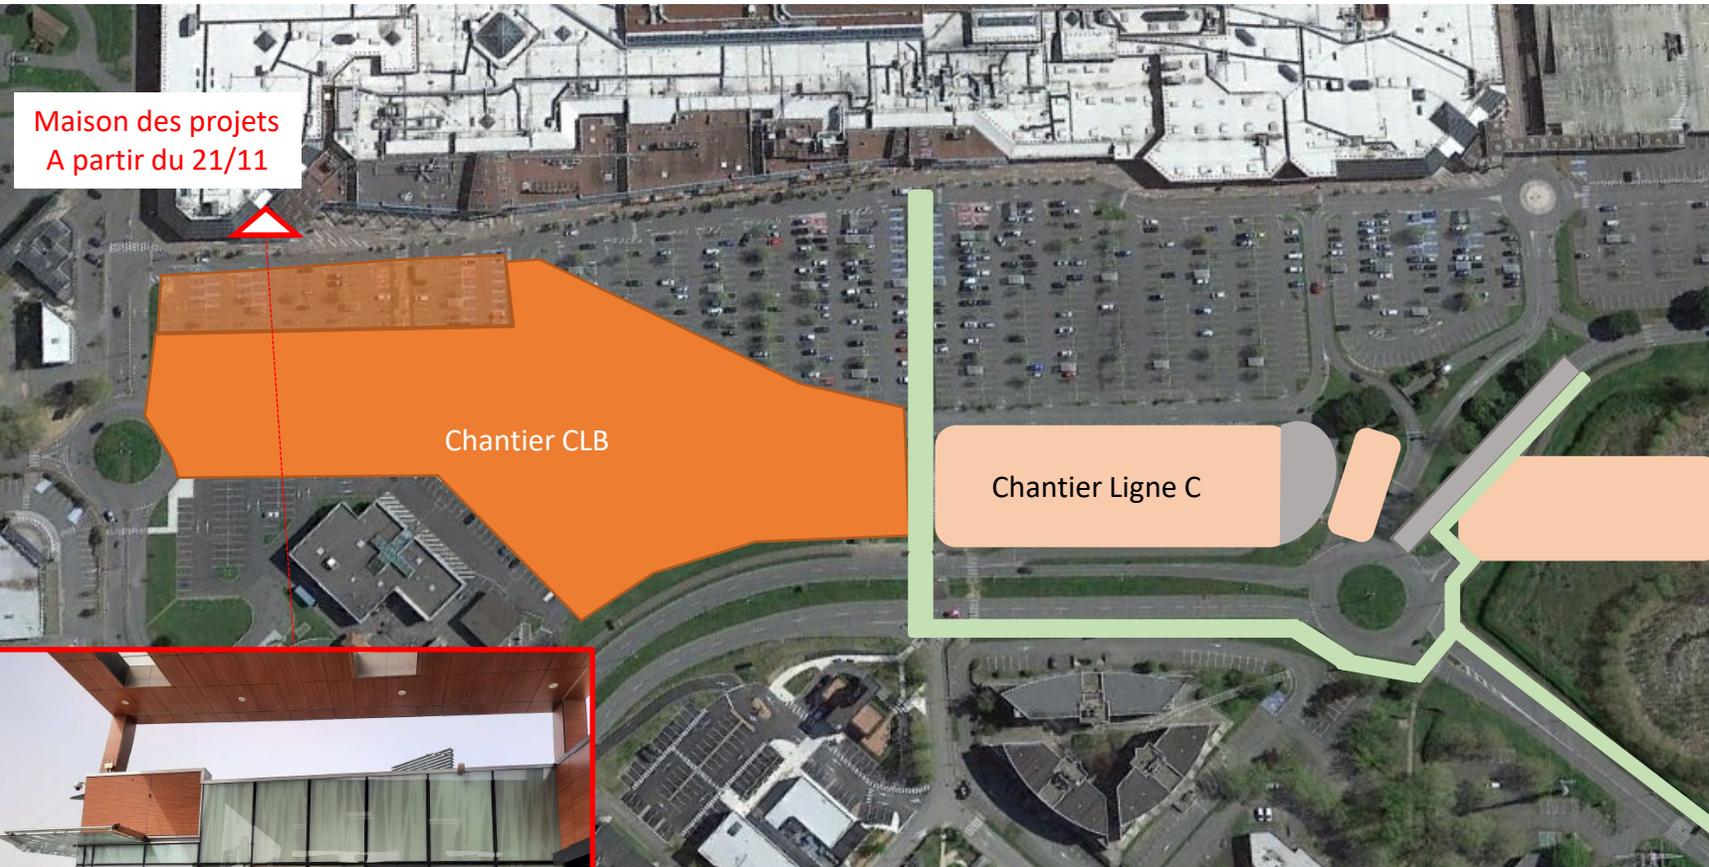



LA LIGNE C AVANCE

CHANTIER LIGNE C – LABEGE – ENOVA /DIAGORA

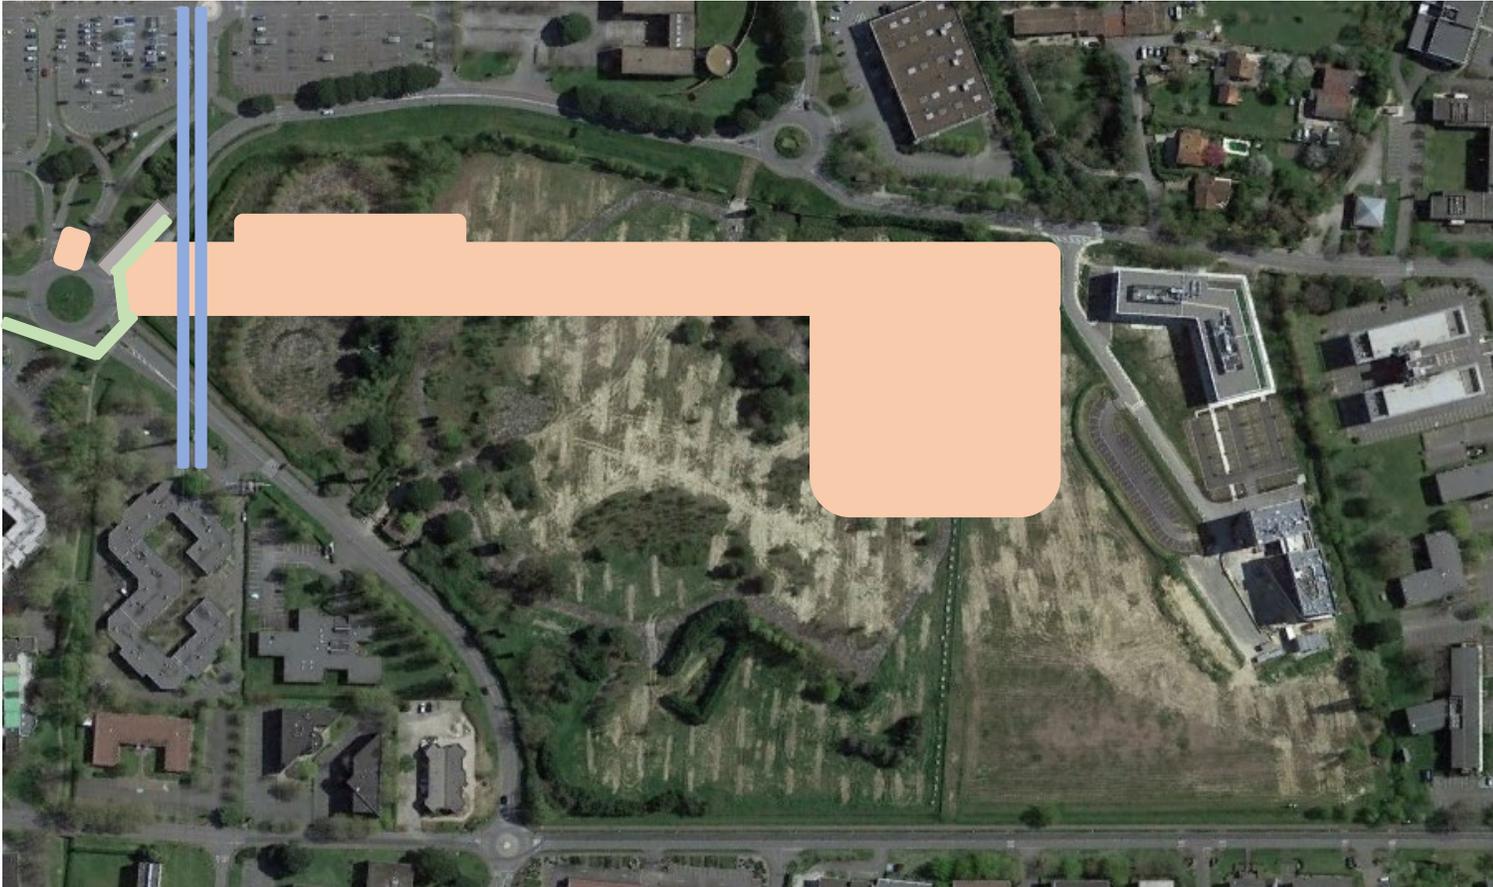

Avancement

Installation de chantier et base vie principale en place

A venir Fin 2023 / T1 2024

1. Travaux réhausse des lignes RTE :
du 7 au 10/11 et du 20 au 23/11/23
(travaux hors heures de pointes : mise en place d'une déviation)
2. Montage de la poutre
3. Travaux de réalisation des pieux puis piles à partir d'octobre 2023



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine
